PROGRAMMA LAVORI IMPIANTO I CIPRESSI

ID	ID	Nome attività	Nomi risorse
1	1	**CONTRATTO**	
2	2	Firma contratto	
3	3	**AGIBILITA' AREA**	
4	4	Agibilità area	
5	5	**INGEGNERIA**	
6	6	Sistemistica e di base	
7	7	Componentistica	
8	8	Impiantistica & civile	
9	9	**APPROVVIGIONAMENTI MECCANICI**	
10	10	Turbina ed accessori	
11	11	Condensatore	
12	12	Griglie e Forni	
13	13	Caldaia	
14	14	Elettofiltro	
15	15	Reattore e Filtro a maniche	
16	16	Scambiatore	
17	17	Denox Reattore	
18	18	Denox Catalizzatore	
19	19	Ventilatore esaustore	
20	20	Camino	
21	21	Ventilatori aria di combustione	
22	22	Sistema estrazione ceneri	
23	23	Sistema estrazione e stoccaggio polveri e residui	
24	24	Pompe alimento	
25	25	Refrattario forno	
26	26	Refrattario caldaia	
27	27	Coibentazioni	
28	28	Materiale bulk	
29	29	**APPROVVIGIONAMENTI ELETTRICI**	
30	30	Sottostazione elettrica	
31	31	Trasformatori	
32	32	Materiale Bulk	
33	33	Quadri M.T.	
34	34	Quadri protezione	
35	35	Quadri M.C.C. & P.C.	
36	36	Impianti ausiliari	
37	37	Sistema C.C. & U.P.S.	
38	38	GES	
39	39	Quadro parallelo e misura	
40	40	**APPROVVIGIONAMENTI STRUMENTAZIONE E CONTR**	
41	41	Valvole di regolazione e By-pass	
42	42	D.C.S.	
43	43	Strumentazione di processo	
44	44	Bulk Material	
45	45	**ATTIVITA' DI CANTIERE LOTTO "A"**	
46	46	Realizzazione protezione idraulica (Argine)	
47	47	Recinzione provvisoria area di proprietà	
48	48	Recinzione provvisoria zona di lavoro	
49	49	Sistemazione uffici e spogliatoi personale di cantiere	
50	50	Scorticamento e rimozione strato superficiale	
51	51	Scavi e movimenti terra per livellamento aree	
52	52	Sistemazione aree di stoccaggio e prep. materiali e aut	
53	53	Scavi per fondazioni	
54	54	Fondazioni	
55	55	Realiz. Canalizzazioni sotterranee per condutture	

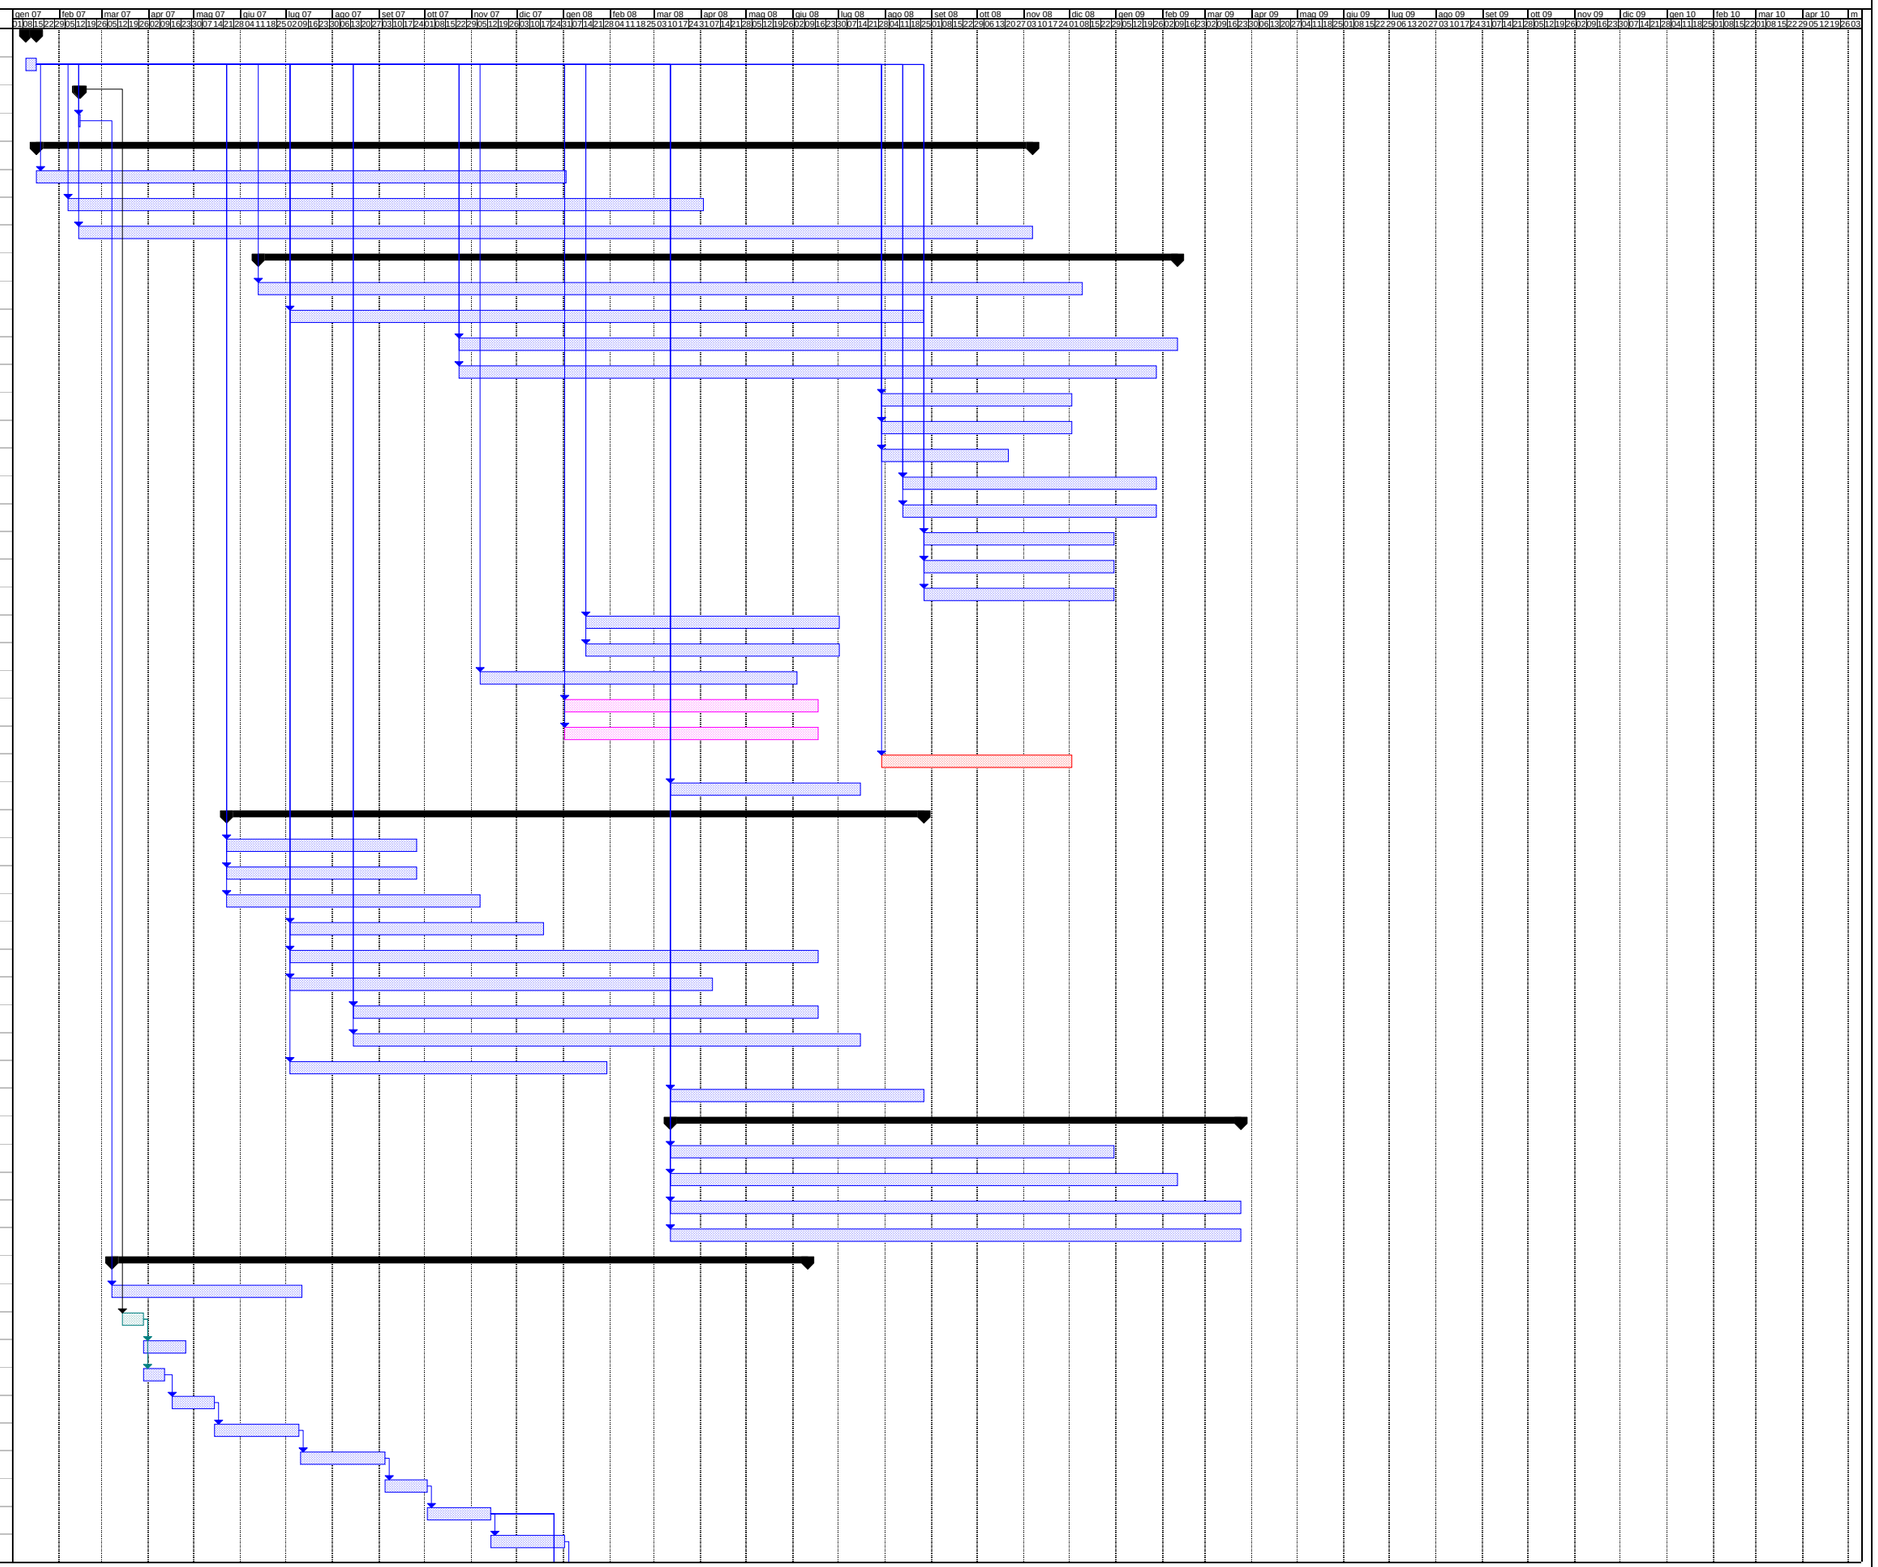

Progetto: " I CIPRESSI "
Data: gio 09/02/06

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Divisione riportata | Avanzamento riportata | Riepilogo progetto | Échéance
Divisione | Cardine | Attività riportata | Cardine riportata | Attività esterne | Jalons externes

PROGRAMMA LAVORI IMPIANTO I CIPRESSI

ID	ID	Nome attività	Nomi risorse
56	56	Realiz. Cavidotti sotterranei	
57	57	Realizzazione e stabilizzazione strade di accesso	
58	58	Stesura cavi, installazione tubazioni, montaggio appare	
59	59	Realiz. Struttura pesa a ponte e montaggio pesa	
60	60	Realiz. Cabina elettrica, cabina gas e vasca antincendi	
61	61	Taglio e rimozione alberi del Lotto B	
62	62	Demolizione recinzione attuale tra lotto A e lotto B	
63	63	Modifica circuito antincendio	
64	64	Modifica impianto elettrico per alimentazione imp. Esist	
65	65	Spostamento GES	
66	**66**	**ATTIVITA' DI CANTIERE LOTTO "B"**	
67	67	Demolizione cordoli e muretti	
68	68	Scorticamento e rimozione strato superficiale	
69	69	Scavi e movimenti terra per livellamento aree	
70	70	Scavi e rinterri area impianti	
71	71	Realiz. canalizzazioni sotterranee per condutture	
72	72	Realiz. cavidotti sotterranei	
73	73	Realizzazione e stabilizzazione strade di accesso	
74	74	Fondazioni edifici	
75	75	Fondazioni componenti principali (FORNO CALDAIA TF	
76	76	Fondazioni edificio turbogruppo	
77	77	Fondazioni impianti minori	
78	78	Drenaggi	
79	79	Demolizione attuale vasca antincendio ed edificio antin	
80	80	Completamento edifici	
81	81	Realizzazione palazzina servizi	
82	**82**	**MONTAGGI MECCANICI**	
83	83	Carpenterie forno	
84	84	Caldaia a recupero	
85	85	Griglie forno	
86	86	Componenti trattamento fumi	
87	87	Turbina a vapore e condesatore	
88	88	Componenti rotanti	
89	89	Impianti ausiliari e servizi vari	
90	**90**	**MONTAGGI ELETTROSTRUMENTALI**	
91	91	Impianto di terra	
92	92	Passerelle e conduits	
93	93	Posa cavi e connessioni	
94	94	Quadri elettrici	
95	95	Trasformatori	
96	96	Impianti ausiliari	
97	97	Strumentazione di campo	
98	98	Sistema di automazione	
99	99	Collegamenti primari e secondari	
100	100	Illuminazione esterna	
101	**101**	**VARIE**	
102	102	Collegamenti meccanici ed elettrostrum. tra Lotto A e B	
103	103	Completamento e finitura edifici	
104	104	Messa al verde	
105	105	Asfaltatura strade	
106	**106**	**AVVIAMENTO COMMISSIONING E PROVE**	
107	107	Prove a freddo	
108	108	Prove a caldo	
109	109	Funzionamento industriale	
110	110	Prove di prestazione	

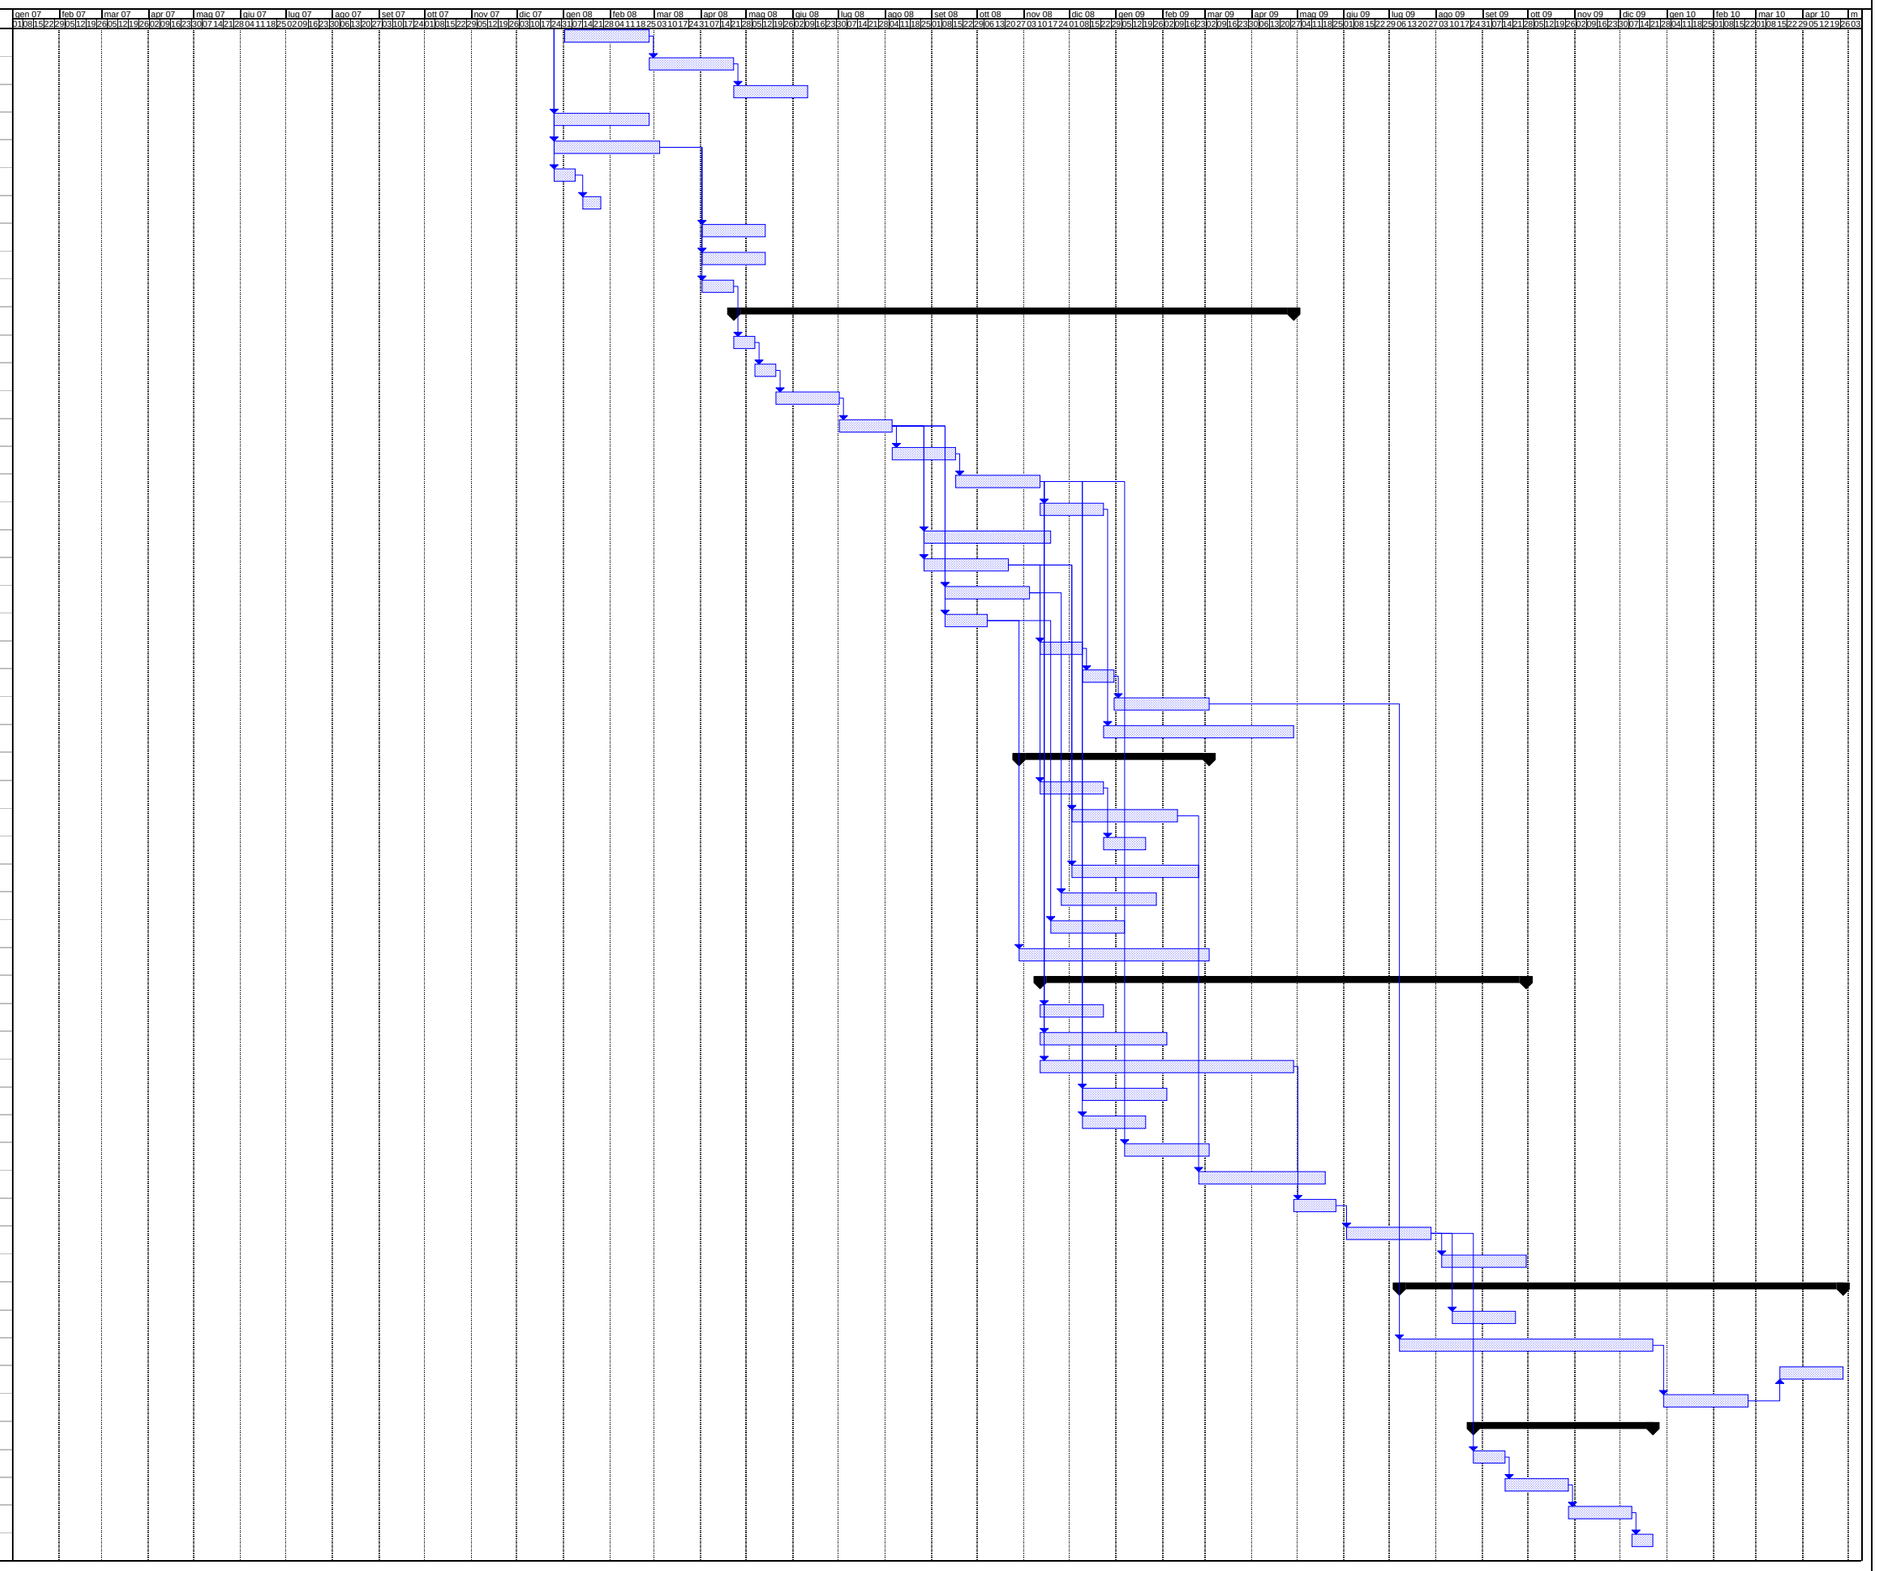

Progetto: " I CIPRESSI "
Data: gio 09/02/06

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Divisione riportata | Avanzamento riportata | Riepilogo progetto | Échéance
Divisione | Cardine | Attività riportata | Cardine riportata | Attività esterne | Jalons externes
